VERBALE DI SOPRALLUOGO

Il giorno 12 ottobre 2026, presso l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, si è svolto il sopralluogo previsto dal programma di ricerca. Sono state esaminate le aree di manutenzione delle caldaie e i locali tecnici, con particolare attenzione agli ambienti confinati e sospetti di inquinamento.

Partecipanti:

- Ing. Mario Rossi – responsabile della sicurezza
- Dott. Giulia Bianchi – ricercatrice
- Sig. Luca Verdi – capoturno

Area	Rischio rilevato	Misura proposta
Caldaia 1	Accesso al passo d'uomo senza procedura scritta	Redigere la procedura di accesso
Tramoggia	Atmosfera potenzialmente povera di ossigeno	Misuratore multigas e ventilazione forzata
Locale pompe	Superfici calde non segnalate	Cartellonistica e protezioni
Note: le misure dovranno essere attuate entro 30 giorni.		

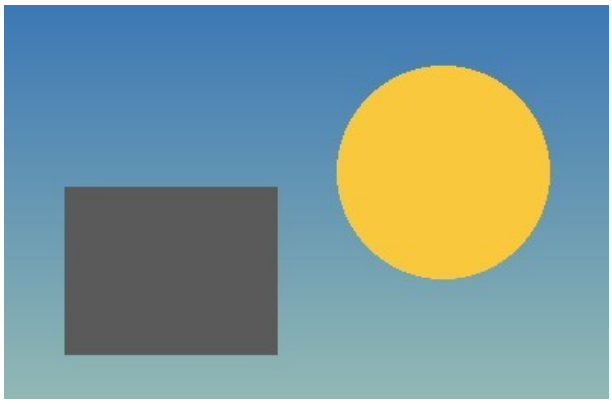

Figura 1 – Passo d'uomo della caldaia

Napoli, 14 ottobre 2026 Il responsabile: _____
